

项目描述

Event




SimulTrain

项目描述

项目名称	ILFT phase B
预计持续时间	1周
里程碑	1.初步规划 2.财务计划 3.物流计划 4.测试完成
团队	-Sue, Fre and Time -若有所需的其他成员
描述	洛桑国际足球锦标赛将聚集一些最重要的欧洲青年足球俱乐部。这是全国联合会第一次组织这次活动。专门从事体育赛事的组织将其所有的资源都分配给了此项赛事。项目“ILFT阶段B”是准备工作的一部分。准备工作必须在开馆前两周完成。


组织机构图表

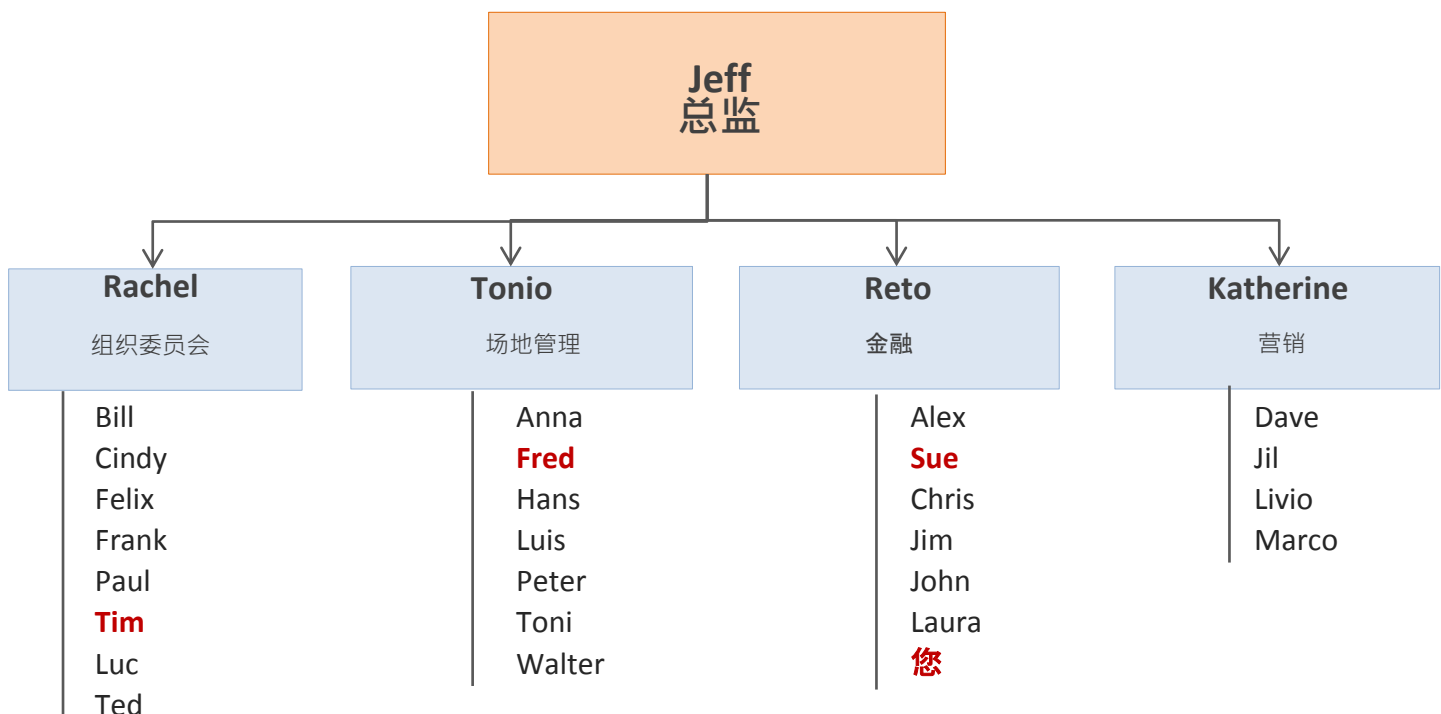

项目任务	员工人数	预计所需时间 (日)	基于之前的任 务/工作/活动	技能要求				
				运动	场地管理	融金	销售	后勤
1 初步规划	2	5	—	2	4	3	2	
2 认证	1	7	1	2	2			2
3 营销计划	2	10	1	1		3	5	
4 赞助	2	12	1		2	3	5	
5 金融计划	2	8	3, 4		2	5		1
6 场地计划	2	13	2, 5	2	4	1		2
7 后勤	4	15	5	1	2			4
8 协议准备	3	14	5	4	3		3	
9 通信计划	3	5	4	3		1	4	
10 电视广播	1	10	6, 9	3		2	4	
11 风险和应急计划	2	11	1	2	2	1		3
12 医疗服务部署	3	6	5	3	3			1
13 运输	4	11	11		3			5
14 设备部署	1	5	7, 12, 13	2	2			3
15 服务测试	3	3	8, 10, 14	3	3			2
16 文档	1	22	2	2	1	2		1
17 官方批准	4	2	15, 16	2	3	3		1

资源	时薪	是否有空档/ 时间来做什么 项目	从第。。。周 有时间/可上 岗	技能				
				运动	场地管理	融金	销售	后勤
Alex	86	100%	4	3	1	2	2	
Anna	160	100%	2	6	5	6	3	
Bill	102	100%	4	3	2	4		2
Cindy	87	80%	3	2	3	3		
Felix	89	100%	6	1		4		1
Fred	89	90%	1	2	4	2		
Hans	135	80%	2	6	3	5	2	
John	125	100%	3	4	6	5		
Livio	97	100%	2	1	1		4	6
Luc	70	70%	3	2		4		
Marco	89	100%	3	1			5	5
Paul	175	100%	4	5	5	6	3	1
Peter	128	80%	2	6	4	4	1	
Sue	151	80%	1	5	3	4	5	3
Ted	58	100%	3	3		3		
Tim	97	100%	1	2		4	3	

活动网络

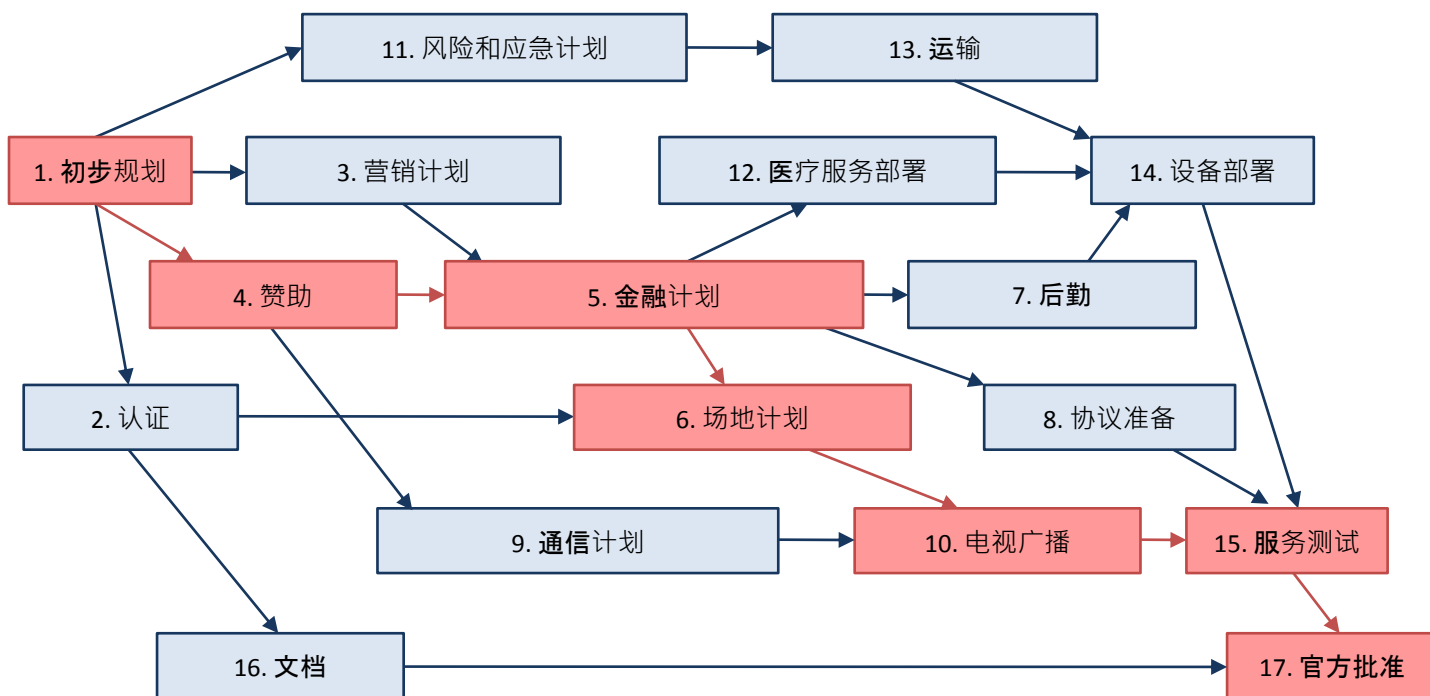

甘特图表

