

SIMULTRAIN® - LES SCENARIOS

Développement d'un service commercial en ligne

Nom du scénario: **e-com**


Description du projet

Conformément à la stratégie commerciale qu'elle a décidée en début d'année, la direction veut mettre à disposition de sa clientèle un service interactif en ligne permettant aux clients d'effectuer toutes les opérations de commande et de suivi sans l'intervention ni du service clientèle ni du service comptabilité.



Pour ce projet, un cahier des charges provisoire vient d'être rédigé, avec la liste des activités, le budget et le délai prévus; le noyau de l'équipe est également formé.

Activités du projet

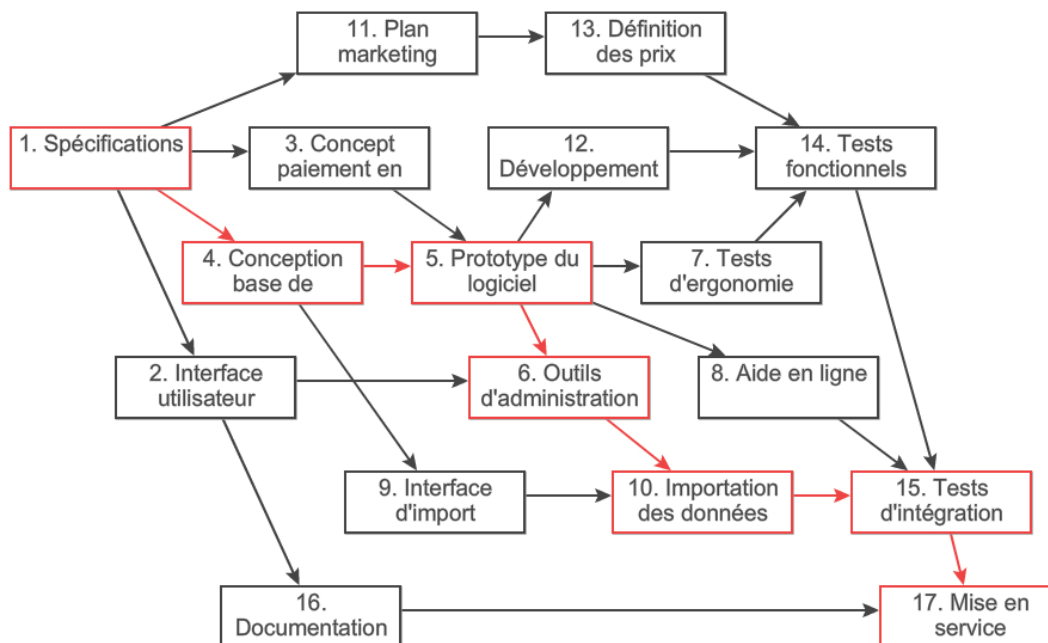

Qualifications

Dans ce scénario, les qualifications requises sont les suivantes:

- Conception Web
- Base de données
- Programmation
- Métier
- Vente + Marketing

Lancement d'un nouveau smartphone

Nom du scénario: **marketing**


Description du projet

Votre société a mis au point un nouveau lecteur multimédia portable. Cet appareil très performant comporte de nombreuses innovations qui le rendent très attractif pour les auditeurs nomades et les consommateurs férus de nouvelles technologies.



La conception de ce produit arrive à son terme et son lancement sur le marché doit maintenant être préparé. C'est l'objet de ce projet pour lequel un cahier des charges provisoire a été rédigé. Ce dernier comporte la liste des activités, le budget et les délais prévus. Le noyau de l'équipe est également défini.

Activités du projet

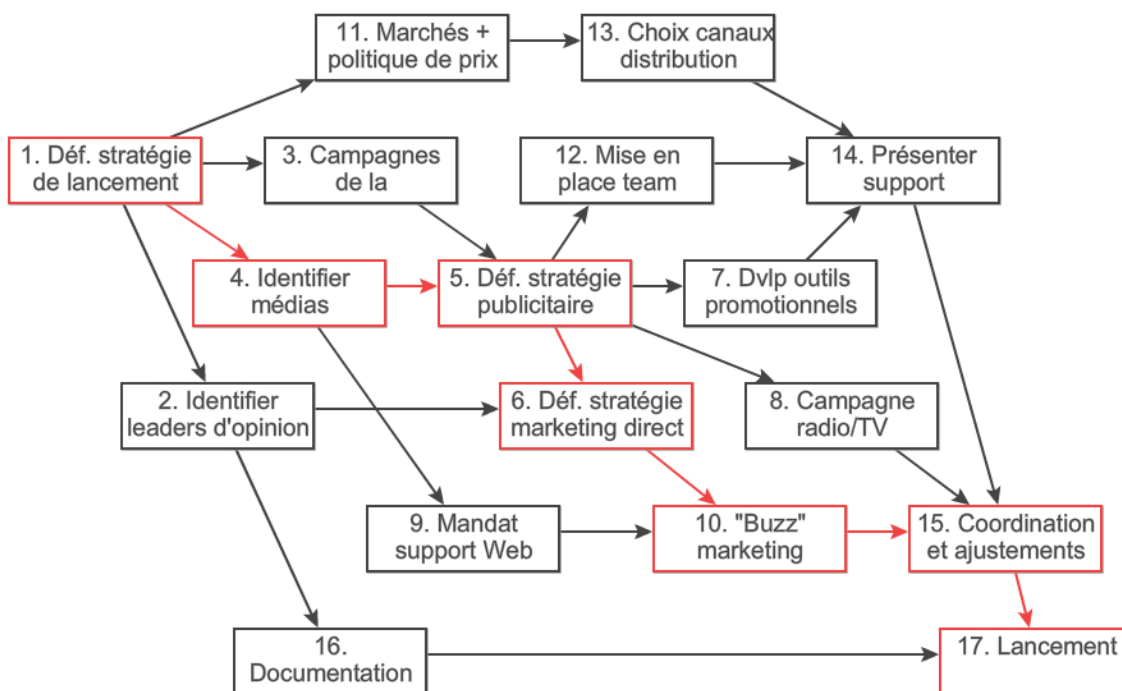

Qualifications

Dans ce scénario, les qualifications requises sont les suivantes:

- Marketing
- Vente
- Relations publiques
- Publicité
- Arts audiovisuels

Organisation d'un tournoi international de football

Nom du scénario: **event**




Description du projet

Le Tournoi International de Football de Lausanne réunira les équipes juniors de certains des clubs de football les plus importants d'Europe. La Fédération Nationale organise l'événement pour la première fois. Une organisation spécialisée dans les événements sportifs alloue toutes ses ressources à l'événement.

Le projet "TIFL phase B" est une partie du processus de préparation. La préparation doit être terminée 2 semaines avant le jour d'ouverture du tournoi. L'équipe de base et le budget ont été définis. D'autres ressources, issues de la Fédération, sont disponibles pour le projet.

Activités du projet

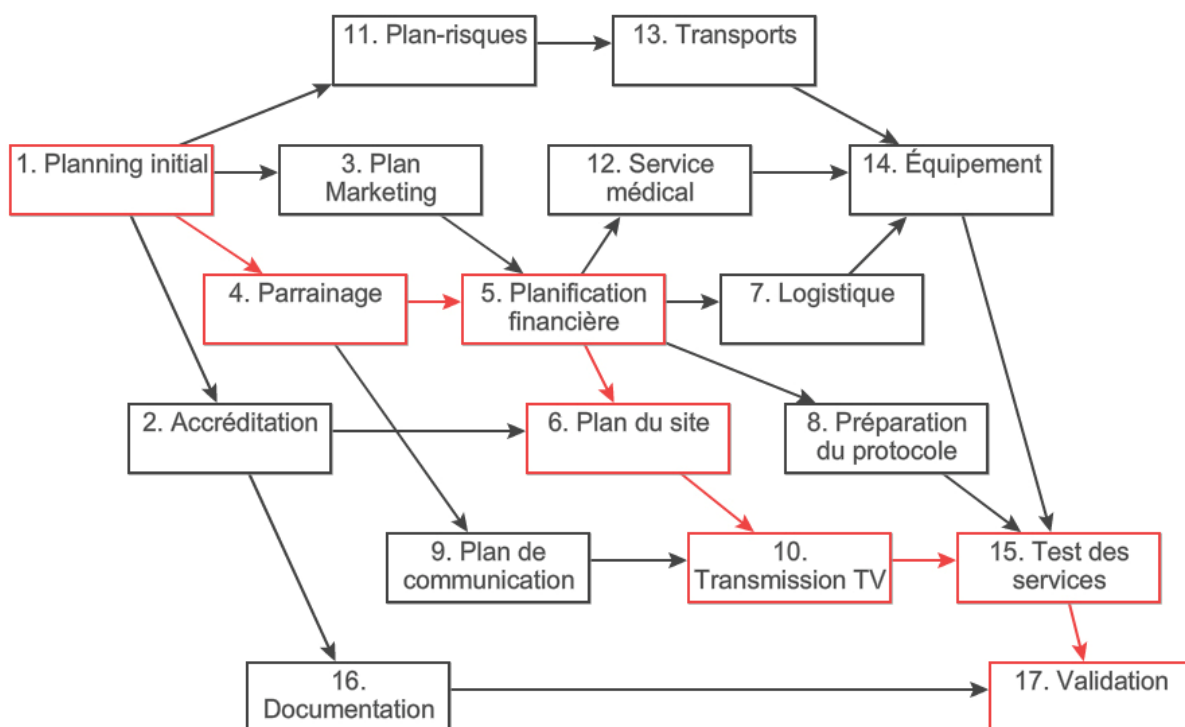

Qualifications

Dans ce scénario, les qualifications requises sont les suivantes:

- Sport
- Événementiel
- Finance
- Marketing
- Logistique

Développement d'un produit de haute technologie

Nom du scénario: **product**




Description du projet

La société Plastoceram est leader dans la fabrication d'emballages spéciaux en matériaux composites. Un de ses clients, fabricant de pacemakers, ne trouve pas de solution satisfaisante pour le boîtier de son dernier modèle ultra miniaturisé.

Il faut développer pour ce client, et dans les plus brefs délais, un boîtier dans une matière qui soit à la fois très résistante, très fine, et aisément façonnable. Pour ce projet, un cahier des charges provisoire vient d'être rédigé, avec la liste des activités, le budget et le délai prévus. Le noyau de l'équipe est également formé.

Activités du projet

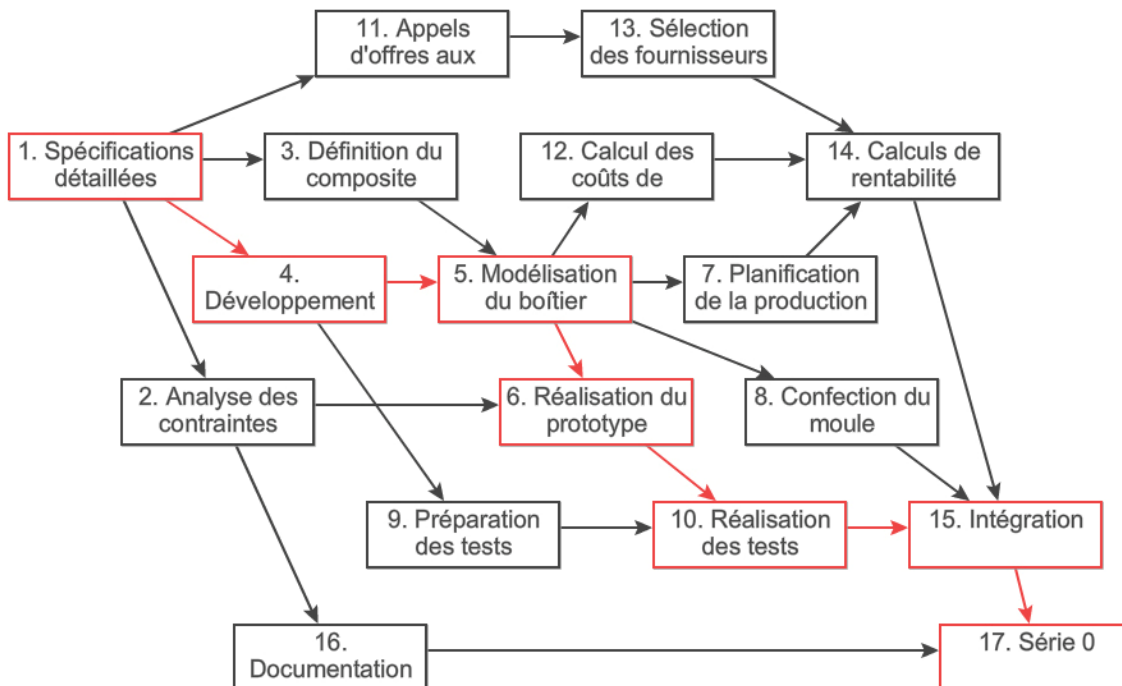


Qualifications

Dans ce scénario, les qualifications requises sont les suivantes:

- Ingénierie
- Tests + Analyse
- Production
- Logistique
- Vente + Marketing

Restructuration d'une entreprise

Nom du scénario: **reorg**




Description du projet

Conformément à la nouvelle stratégie définie par l'entreprise au début de l'année, la direction a décidé de repenser complètement l'organisation afin de relever les défis d'un marché en constante évolution. Les nouvelles mesures doivent permettre d'améliorer la capacité de l'entreprise de répondre aux attentes des clients et ainsi d'être plus performante. Ces nouvelles dispositions doivent également permettre d'améliorer l'efficacité du réseau de partenaires.

Pour ce projet de réorganisation, on a défini un échéancier provisoire, avec une liste d'activités. On a aussi fixé le budget et les délais, et désigné l'équipe de base.

Activités du projet

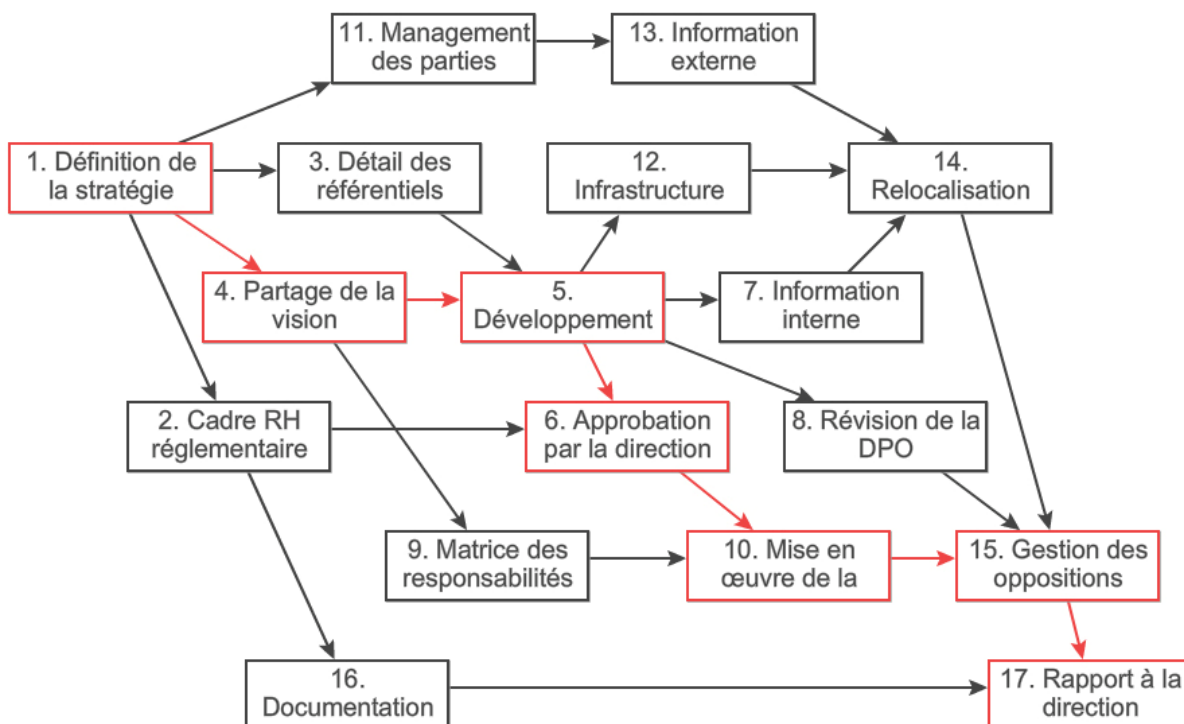

Qualifications

Dans ce scénario, les qualifications requises sont les suivantes:

- Management de projet
- Ressources humaines
- Opérations
- Communication + Relations publiques
- Management des contrats


Planification de la construction d'une raffinerie

Nom du scénario: **oil & gas**


Description du projet

Votre compagnie possède plusieurs raffineries. La Direction Générale veut répondre rapidement à la demande croissante en essence de haute qualité. À cet effet, il faut acheter et installer des équipements supplémentaires pour chaque raffinerie.

Un sous-projet pour la planification des réaménagements vient d'être lancé: le calendrier provisoire est établi, avec la liste des activités, le budget et les délais; on a également désigné l'équipe de base.

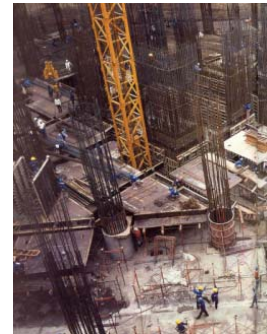

Activités du projet

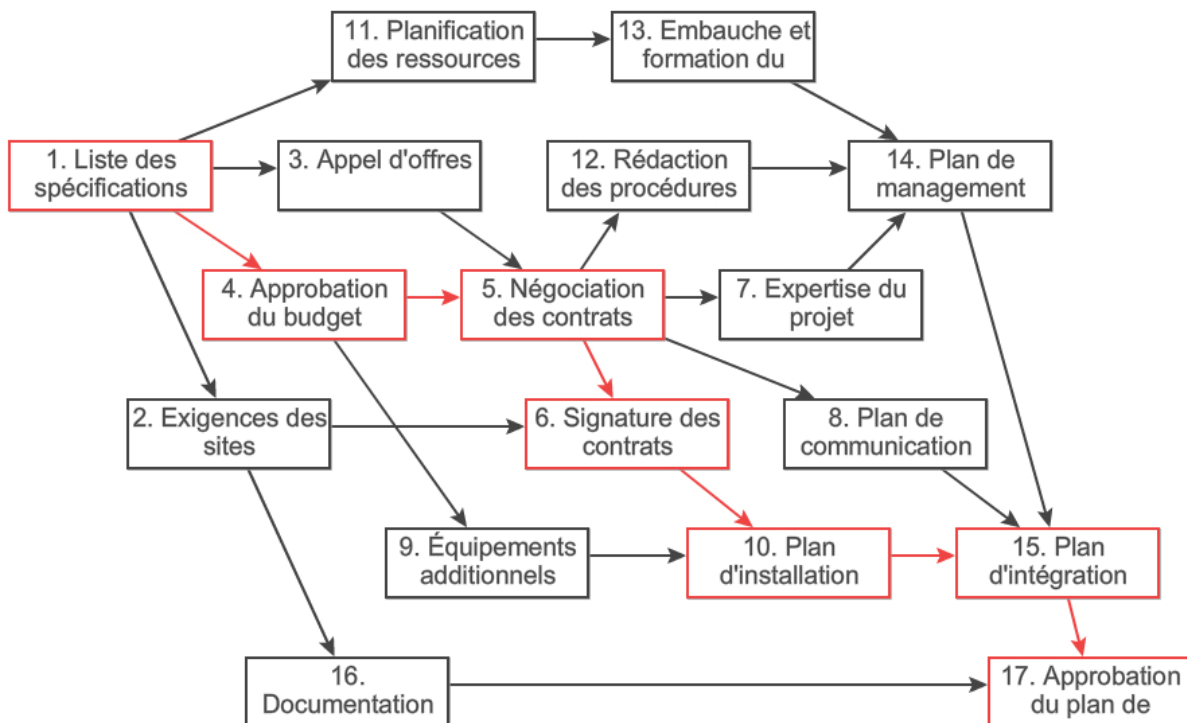

Qualifications

Dans ce scénario, les qualifications requises sont les suivantes:

- Pétrochimie
- Construction
- Finances
- Approvisionnements
- Ressources humaines

Développement logiciel

Nom du scénario: **agilehybrid**




Description du projet

Conformément à la nouvelle stratégie marketing, la direction souhaite offrir à nos clients un service interactif en ligne. Ce service doit permettre aux clients de suivre et contrôler leurs commandes sans l'intervention ni du service client ni du service comptabilité. Le représentant du client est le directeur de produit.

Pour la première étape, on a défini la liste des items du backlog du produit. Le noyau de l'équipe est également constitué.

Activités du projet

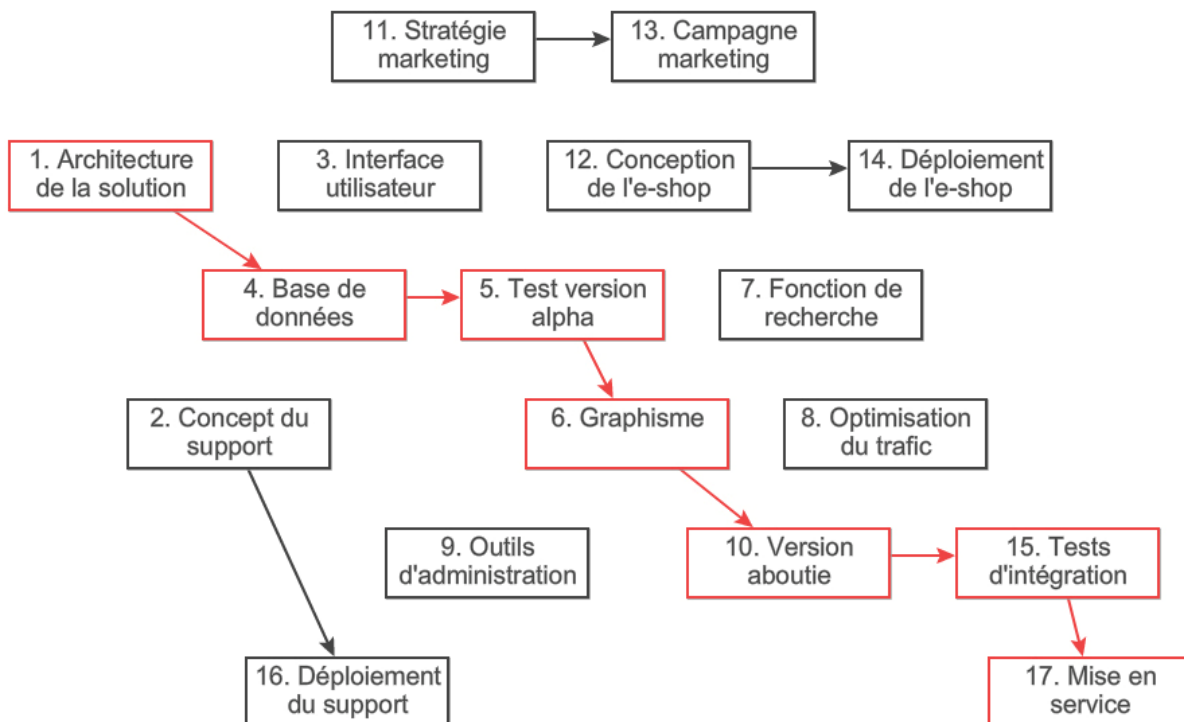

Qualifications

Dans ce scénario, les qualifications requises sont les suivantes:

- Conception Web
- Base de données
- Programmation
- Métier
- Vente + Marketing
