

Projectbeschrijving

ecom




SimulTrain

Projectbeschrijving

Naam van het project	e-com
Geschatte duur	11 weken
Mijlpalen	<ol style="list-style-type: none">1. Goedkeuring van de specificaties2. Prototype van de software klaar3. Testen afgerond4. Deployment completed
Team	<ul style="list-style-type: none">– Sue, Fred en Tim– Andere medewerkers volgens behoefte
Omschrijving	Conform de commerciële strategie die in het begin van het jaar werd bepaald, wenst de directie haar klanten een interactieve online service aan te bieden die hen in staat stelt bestellingen door te voeren en op te volgen zonder dat daarvoor enige tussenkomst van de afdeling verkoop of de boekhouding nodig is. Voor dit project werd een voorlopig (project) plan opgesteld, met een lijst van activiteiten, het voorziene budget en de voorziene termijnen; ook het kernteam is reeds gevormd.


Organigram

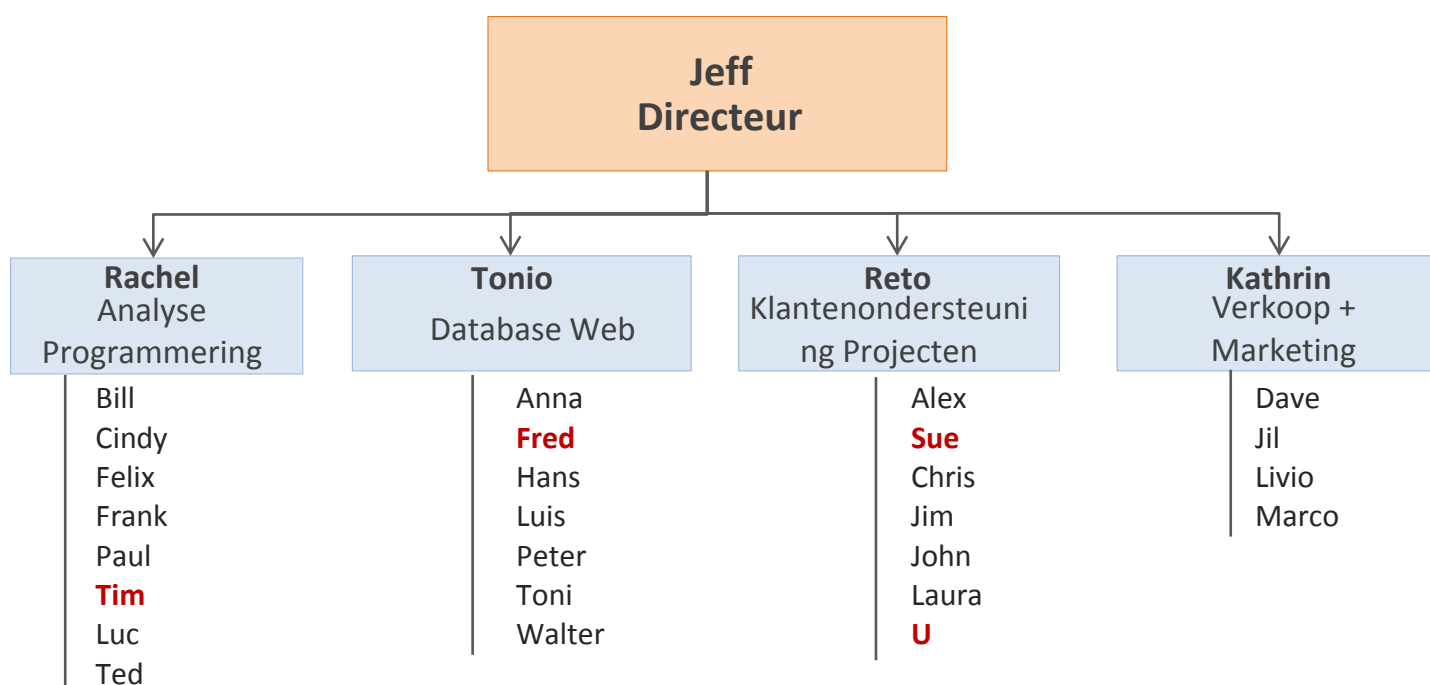

	Projectactiviteit	Aantal medewerkers	Geschatte duur (dagen)	Hangt van voorgaande activiteiten af	Vereiste kwalificaties				
					Webdesign	Database	Programmeren	Domein	Verkoop + Marketing
1	Specificaties	2	5	—	2			5	3
2	Gebruikersinterface	1	7	1	5			2	
3	ePayment-concept	2	10	1	3	1		4	3
4	Databaseontwerp	2	12	1	1	6	3		
5	Softwareprototype	2	8	3, 4	4	3	4		
6	Administratieve tools	2	13	2, 5	1	2	4	3	
7	Ergonomische tests	4	15	5	2	1		2	
8	Online Help	3	14	5	1		3	2	
9	Importinterface	3	5	4	2	5	2		
10	Gegevensinvoer	1	10	6, 9		3		2	
11	Marketingplan	2	11	1				4	6
12	IT-ontwikkeling	3	6	5	3	3	5		
13	Prijsbepaling	4	11	11				3	5
14	Functionele tests	1	5	7, 12, 13	1		3		
15	Integratietests	3	3	8, 10, 14	2		1	2	
16	Documentatie	1	22	2	3	1	3	2	
17	Indienststelling	4	2	15, 16	1		4	3	

Resourcetabel	Uurtarief	Beschikbaarheid voor het project, %	Beschikbaar vanaf week	Vaardigheden				
				Webdesign	Database	Programmeren	Domein	Verkoop + Marketing
Alex	86	100%	4	3	1	2	2	
Anna	160	100%	2	6	5	6	3	
Bill	102	100%	4	3	2	4		2
Cindy	87	80%	3	2	3	3		
Felix	89	100%	6	1		4		1
Fred	89	90%	1	2	4	2		
Hans	135	80%	2	6	3	5	2	
John	125	100%	3	4	6	5		
Livio	97	100%	2	1	1		4	6
Luc	70	70%	3	2		4		
Marco	89	100%	3	1			5	5
Paul	175	100%	4	5	5	6	3	1
Peter	128	80%	2	6	4	4	1	
Sue	151	80%	1	5	3	4	5	3
Ted	58	100%	3	3		3		
Tim	97	100%	1	2		4	3	

Activiteitennetwerk

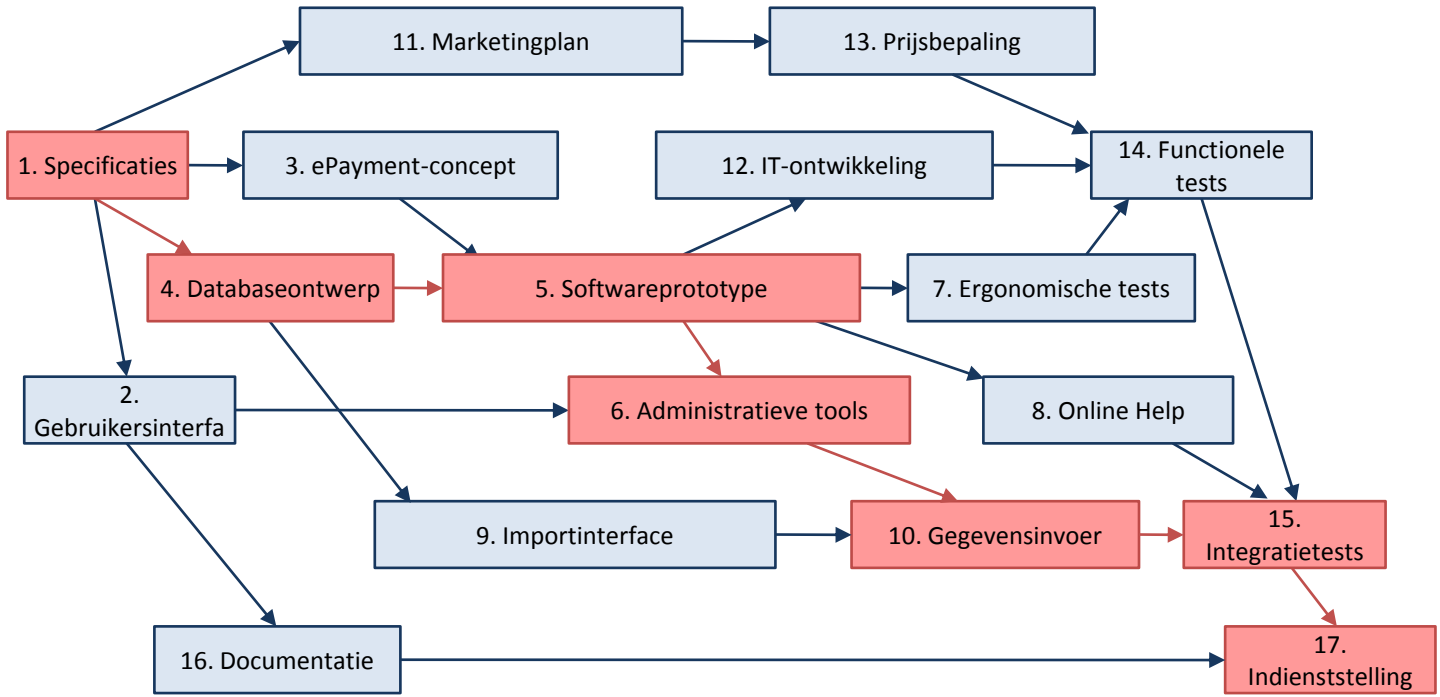

Gantt-diagram

