

# Descrição do Projecto

reorg




# *SimulTrain*

# Descrição do Projecto

Nome do projecto	<b>Reorganização empresarial</b>
Duração estimada	11 semanas
Milestones	<ul style="list-style-type: none"><li>– Aprovação pela Administração</li><li>– Revisão dos Objetivos</li><li>– Implementação da Solução</li><li>– Relatório para a Gestão</li></ul>
Equipa	<ul style="list-style-type: none"><li>– Maria, Rui e Lucas</li><li>– Outros colaboradores se necessário</li></ul>
Descrição	Em linha com a nova estratégia da empresa, definida no início do ano, a administração decidiu redesenhar a organização da companhia com o objetivo de se ajustar aos novos desafios do mercado. Novas medidas melhorarão a capacidade de responder melhor e mais rápido às expectativas dos clientes e aumentarão a eficiência da rede global de parceiros. Foi definido um cronograma preliminar e um orçamento para o projeto. Foi igualmente designada a equipa nuclear.


## Organograma

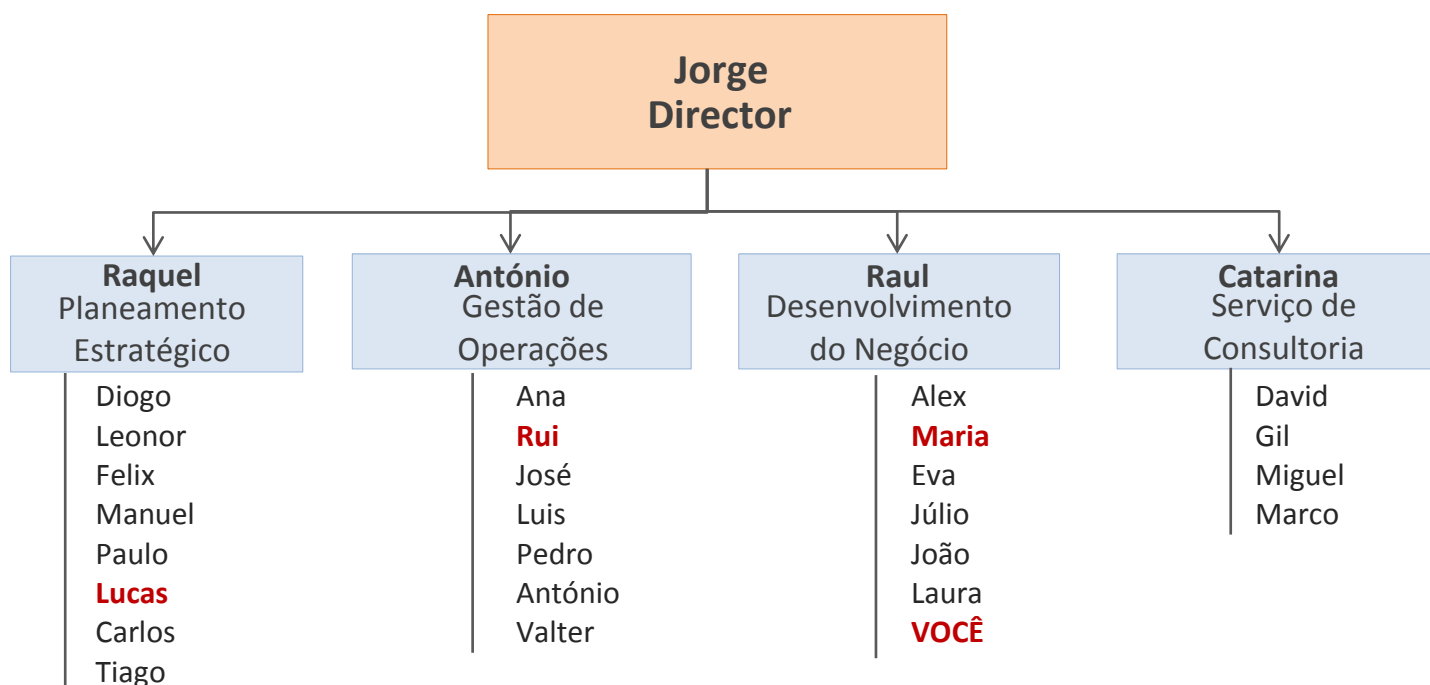

	Actividades do projecto	Número de pessoas	Duração estimada (dias)	Depende das actividades precedentes	Competências requeridas				
					Gestão de Projeto	Recursos Humanos	Gestão de Operações	Comunicação + RP	Gestão de Contratos
1	Definir Estratégia	2	5	—	3	2	2	3	
2	Regulamento de RH	1	7	1		5	1	3	1
3	Definir Orientações Detalhadas	2	10	1	4		2	3	2
4	Partilhar Visão	2	12	1	3	3		5	
5	Desenvolver Solução	2	8	3, 4	4		4	2	2
6	Aprovar pela Gestão	2	13	2, 5	4	1		4	
7	Comunicação Interna	4	15	5	3	1	1	5	2
8	Rever os Objetivos	3	14	5	3	1	2	3	
9	Matriz de Responsabilidades	3	5	4	3	4	2	2	
10	Implementar a Solução	1	10	6, 9	2	1	4	3	1
11	Gerir os Stakeholders	2	11	1	3	2		4	3
12	Instalar Infraestrutura	3	6	5	2		3	3	4
13	Comunicação Externa	4	11	11	3			5	3
14	Mudar de Local	1	5	7, 12, 13			1	2	4
15	Gerir a Resistência	3	3	8, 10, 14		2	4	3	1
16	Elaborar Documentação	1	22	2	4	2	3	2	1
17	Reportar à Gestão	4	2	15, 16	3		2	4	2

Tabela de recursos	Preço Hora	Disponibilidade para o projecto, %	Disponível a partir da semana	Competências				
				Gestão de Projeto	Recursos Humanos	Gestão de Operações	Comunicação + RP	Gestão de Contratos
Alex	86	100%	4	3	1	2	2	
Ana	160	100%	2	6	5	6	3	
Diogo	102	100%	4	3	2	4		2
Leonor	87	80%	3	2	3	3		
Felix	89	100%	6	1		4		1
Rui	89	90%	1	2	4	2		
José	135	80%	2	6	3	5	2	
João	125	100%	3	4	6	5		
Miguel	97	100%	2	1	1		4	6
Carlos	70	70%	3	2		4		
Marco	89	100%	3	1			5	5
Paulo	175	100%	4	5	5	6	3	1
Pedro	128	80%	2	6	4	4	1	
Maria	151	80%	1	5	3	4	5	3
Tiago	58	100%	3	3		3		
Lucas	97	100%	1	2		4	3	

# Rede de Activ.

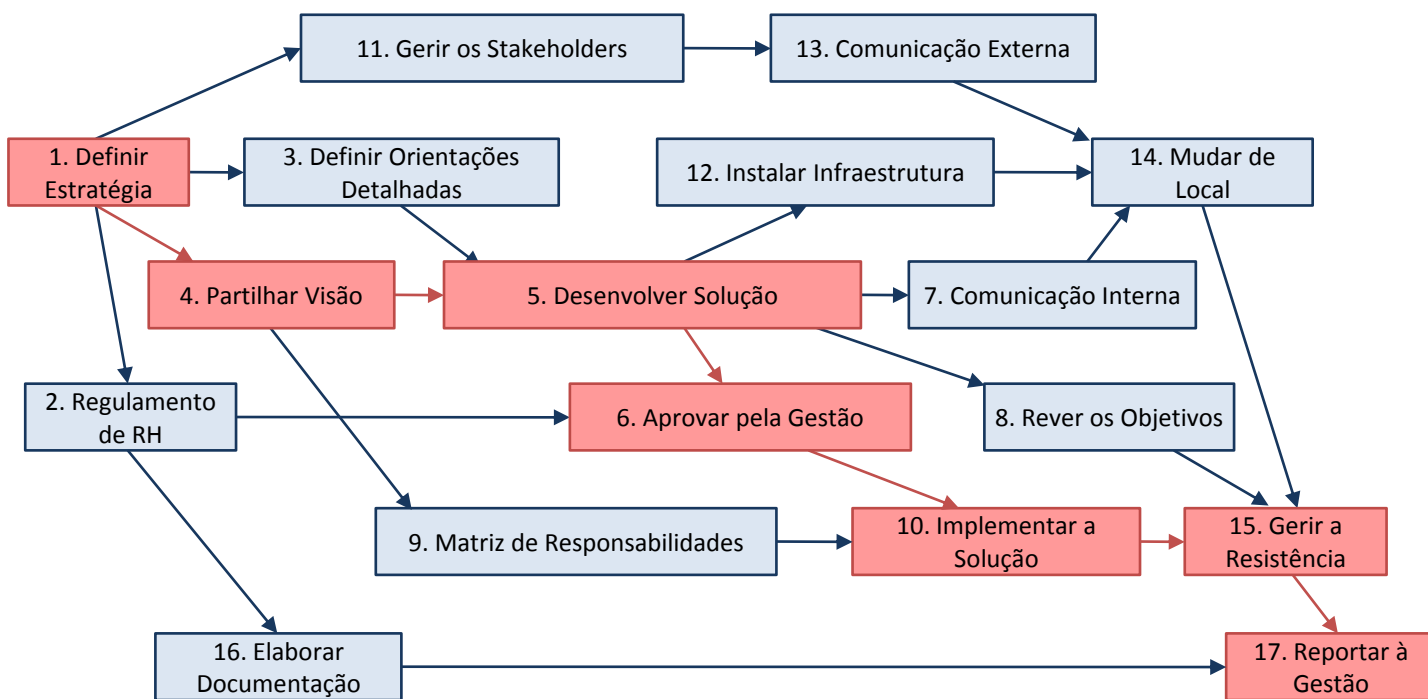

# Diagrama de Gantt

