

Projektbeschreibung

agilehybrid




SimulTrain

Projektbeschreibung

Projektname	Aufbau eines Online Dienstes
Geschätzte Dauer	11 Wochen
Meilensteine	<ol style="list-style-type: none">1. Abnahme der Spezifikationen2. Prototyp der Software bereit3. Tests beendet4. Software betriebsbereit
Team	<ul style="list-style-type: none">– Sue, Fred und Tim– Weitere Mitarbeiter je nach Bedarf
Kurzprofil	Gemäss der neuen Marketing-Strategie wünscht das Management, den Kunden ein interaktiver Online-Dienst zur Verfügung zu stellen. Dies würde den Kunden erlauben, die Bestellungen zu verfolgen und zu kontrollieren, ohne dass sich der Kundendienst oder die Buchhaltung einschalten muss. Der Vertreter des Kundendienstes ist der „Product Owner“. Eine Liste mit den rückständigen Produktteilen und das Budget für die erste Etappe wurden erstellt. Das Kernteam wurde gebildet.

Organigramm

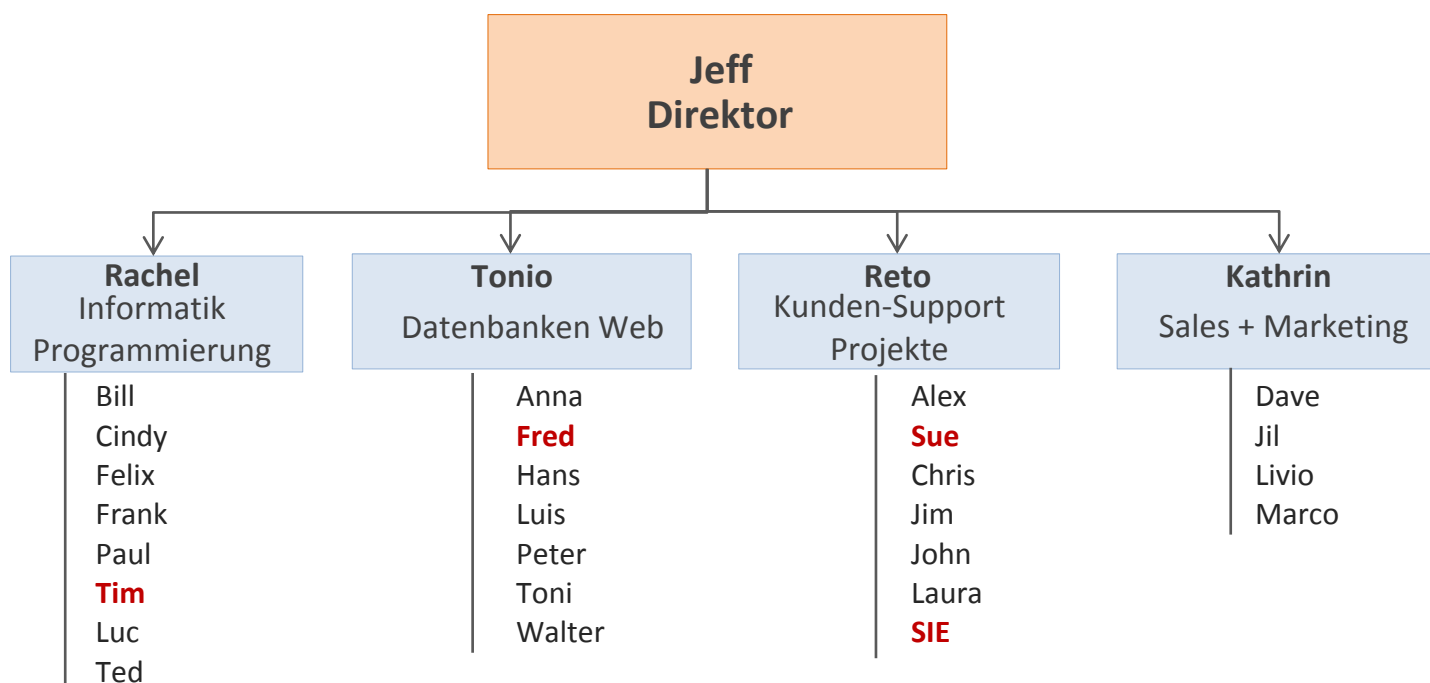

				Erforderliche Qualifikationen				
Backlog Items	Anzahl der Mitarbeiter	Geschätzte Dauer (Tage)	Ist abhängig von den vorangehenden Vorgängen	Web Design	Datenbanken	Programmierung	Business	Sales + Mkg
				1	Lösungsarchitektur	2	5	—
2	Unterstützungskonzept	1	7	—	5		2	
3	Anwendungsoberfläche	2	10	—	4	2	3	1
4	Entwicklung der Datenbank	2	12	1	1	6	3	
5	Testen der Alpha-Version	2	8	4	3	1	2	2
6	Graphische Darstellung	2	13	5	5	1	1	3
7	Umsetzung der Such-Funktion	4	15	—	3	2	3	
8	Optimierung des Datenverkehrs	3	14	—	1	2	4	
9	Verwaltungsinstrumente	3	5	—	5	1	2	1
10	Zur Freigabe fertige Version	1	10	6	3		3	2
11	Marktstrategie	2	11	—			4	6
12	eShop Design	3	6	—	3	1	4	2
13	Marktkampagne	4	11	11			3	5
14	eShop Entwicklung	1	5	12	4		1	2
15	Integrations-test	3	3	10	2		1	2
16	Aufbau der	1	22	2	5		2	
17	Allgemeine Verfügbarkeit	4	2	15	3		3	2

				Qualifikationen				
Ressourcen	Stundensatz	Verfügbarkeit für das Projekt	Verfügbar ab Woche	Web Design	Datenbanken	Programmierung	Business	Sales + Mkg
				Alex	86	100%	4	3
Anna	160	100%	2	6	5	6	3	
Bill	102	100%	4	3	2	4		2
Cindy	87	80%	3	2	3	3		
Felix	89	100%	6	1		4		1
Fred	89	90%	1	2	4	2		
Hans	135	80%	2	6	3	5	2	
John	125	100%	3	4	6	5		
Livio	97	100%	2	1	1		4	6
Luc	70	70%	3	2		4		
Marco	89	100%	3	1			5	5
Paul	175	100%	4	5	5	6	3	1
Peter	128	80%	2	6	4	4	1	
Sue	151	80%	1	5	3	4	5	3
Ted	58	100%	3	3		3		
Tim	97	100%	1	2		4	3	

Netzplan

