



# Mô tả dự án

Oil & Gas




# *SimulTrain*

# Mô tả dự án

Tên dự án	<b>Nâng cấp nhà máy lọc dầu</b>
Thời gian ước tính	11 tuần
Các cột mốc	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hoàn thành đặc tả kỹ thuật dự án</li><li>2. Ký hợp đồng</li><li>3. Hoàn thành kế hoạch dự án</li><li>4. Kế hoạch sản xuất được duyệt</li></ol>
Đội dự án	- Sue, Fred và Tim – Những người khác nếu cần thiết
Mô tả	Công ty của bạn sở hữu một số nhà máy lọc dầu. Lãnh đạo công ty muốn có sự đáp ứng nhanh chóng với nhu cầu đang gia tăng về sản phẩm xăng dầu chất lượng cao. Yêu cầu của dự án là mua và lắp đặt các thiết bị bổ sung. Một dự án thành phần được khởi tạo cho mục tiêu này, kế hoạch đã được dự kiến với đầy đủ thông tin các hoạt động, ngân sách, thời gian. Nhóm lõi (core team) cũng đã được thiết lập .


# Biểu đồ tổ chức

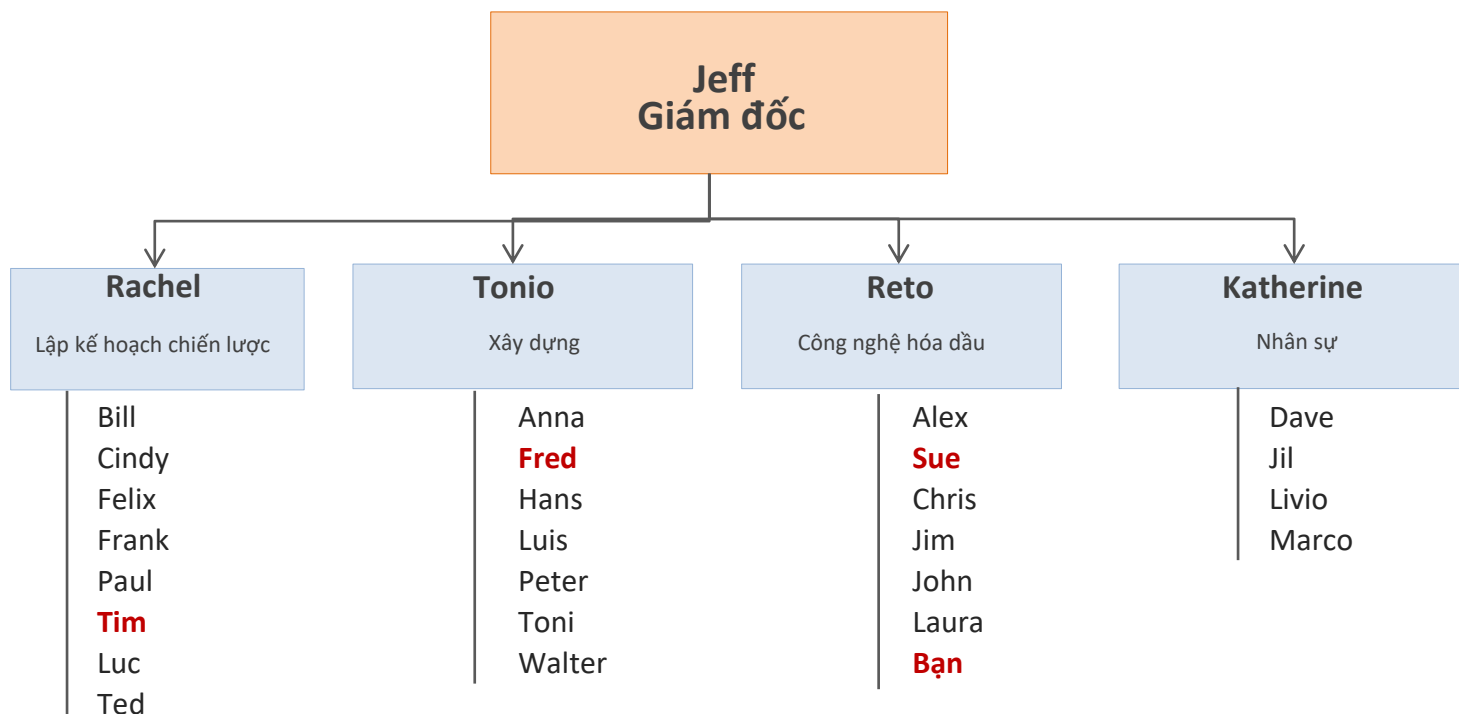

	Các hoạt động của dự án	Số lượng nhân viên	Thời gian ước tính (ngày)	Phụ thuộc vào các hoạt động trước	Các kỹ năng cần có				
					Công nghệ hóa đầu	Xây dựng	Tài chính	Mua sắm	Nhân sự
1	Liệt kê các đặc tả kỹ thuật	2	5	—	3	2		3	
2	Khảo sát thực địa	1	7	1	2	5		2	
3	Mời thầu	2	10	1	3	1		4	2
4	Phê duyệt ngân sách	2	12	1	1	2	5		
5	Thương thảo hợp đồng	2	8	3, 4	3	3	4		2
6	Ký hợp đồng	2	13	2, 5			5	4	
7	Phân tích, lập kế hoạch dự án	4	15	5	3	2	2		
8	Lập kế hoạch giao tiếp	3	14	5	3		2		2
9	Mua thiết bị bổ sung	3	5	4	5	2		1	
10	Lập kế hoạch lắp đặt	1	10	6, 9	3	2			2
11	Lập kế hoạch nhân sự	2	11	1	1		2		5
12	Tài liệu hóa vận hành	3	6	5	5	2			2
13	Tuyển và đào tạo nhân viên	4	11	11	4	2			5
14	Lập kế hoạch quản lý rủi ro	1	5	7, 12, 13	5	2	3		3
15	Lập kế hoạch tích hợp	3	3	8, 10, 14	3		1	2	
16	Tài liệu	1	22	2	3	1		2	
17	Phê duyệt kế hoạch sản xuất	4	2	15, 16	2		4	3	

	Nguồn nhân lực	Lương theo giờ	Sẵn có cho dự án	Rảnh từ tuần	Các kỹ năng				
					Công nghệ hóa đầu	Xây dựng	Tài chính	Mua sắm	Nhân sự
	Alex	86	100%	4	3	1	2	2	
	Anna	160	100%	2	6	5	6	3	
	Bill	102	100%	4	3	2	4		2
	Cindy	87	80%	3	2	3	3		
	Felix	89	100%	6	1		4		1
	Fred	89	90%	1	2	4	2		
	Hans	135	80%	2	6	3	5	2	
	John	125	100%	3	4	6	5		
	Livio	97	100%	2	1	1		4	6
	Luc	70	70%	3	2		4		
	Marco	89	100%	3	1			5	5
	Paul	175	100%	4	5	5	6	3	1
	Peter	128	80%	2	6	4	4	1	
	Sue	151	80%	1	5	3	4	5	3
	Ted	58	100%	3	3		3		
	Tim	97	100%	1	2		4	3	

# H.động

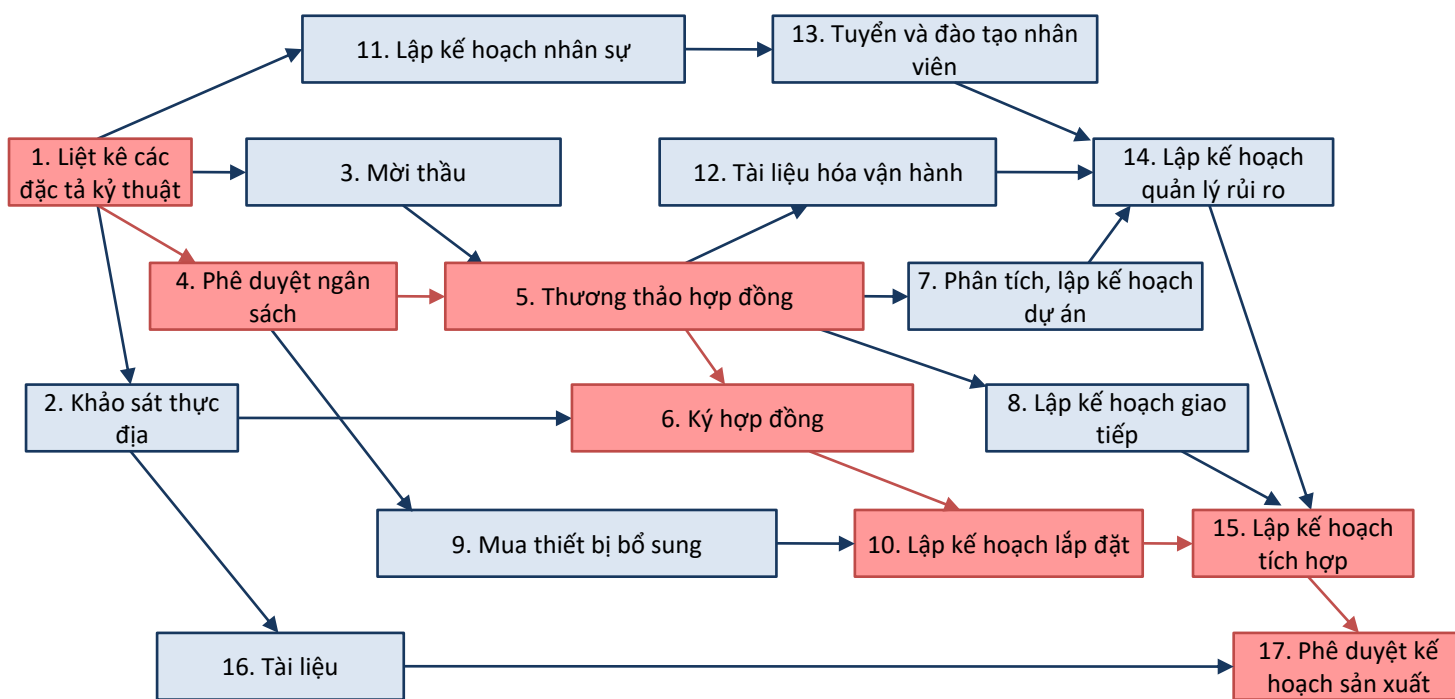

# Gantt

