


Описание проекта

event



SimulTrain

Описание проекта

Проект	МТФ-этап Б
Продолжительность	11 недель
Контрольное событие	1. Предварительный план – 2. Составление бюджета – 3. План перемещений – 4. Пробное тестирование
Команда	- Сью, Федор и Тимур - Другие сотрудники, если требуется
Описание	Ассоциация «МегаФутбол» организует Международный турнир по футболу (МТФ) среди команд спортсменов с ограниченными возможностями. На турнир предполагается собрать футбольные команды из России и ближнего зарубежья. Определены список основных операций, бюджет, сроки, а также основная команда проекта.

Структура фирмы



	Задания проекта	Число людей	Продолжительность (дня)	Зависит от предыдущих заданий	Требуемая квалификация				
					Спорт	Организация	Финансы	Маркетинг	Снабжение
1	Разработка концепции	2	5	—	2	4	3	2	
2	Аккредитация	1	7	1	2	2			2
3	План маркетинга	2	10	1	1		3	5	
4	Контракты со спонсорами	2	12	1		2	3	5	
5	План финансирования	2	8	3, 4		2	5		1
6	План мероприятия	2	13	2, 5	2	4	1		2
7	План поставок	4	15	5	1	2			4
8	Подготовка протокола	3	14	5	4	3		3	
9	План коммуникаций	3	5	4	3		1	4	
10	План работы со СМИ	1	10	6, 9	3		2	4	
11	План по рискам	2	11	1	2	2	1		3
12	План медобслуживания	3	6	5	3	3			1
13	План размещения	4	11	11		3			5
14	Установка оборудования	1	5	7, 12, 13	2	2			3
15	Тестирование сервисов	3	3	8, 10, 14	3	3			2
16	Документация	1	22	2	2	1	2		1
17	Официальная приемка	4	2	15, 16	2	3	3		1

Персонал	Часовая ставка	Доступен для проекта	Свободен начиная с недели	Квалификация				
				Спорт	Организация	Финансы	Маркетинг	Снабжение
Алексей	86	100%	4	3	1	2	2	
Анна	160	100%	2	6	5	6	3	
Борис	102	100%	4	3	2	4		2
Светлана	87	80%	3	2	3	3		
Феликс	89	100%	6	1		4		1
Фёдор	89	90%	1	2	4	2		
Геннадий	135	80%	2	6	3	5	2	
Денис	125	100%	3	4	6	5		
Леонид	97	100%	2	1	1		4	6
Игорь	70	70%	3	2		4		
Михаил	89	100%	3	1			5	5
Поль	175	100%	4	5	5	6	3	1
Петр	128	80%	2	6	4	4	1	
Сью	151	80%	1	5	3	4	5	3
Тарас	58	100%	3	3		3		
Тимур	97	100%	1	2		4	3	

Сетевой график

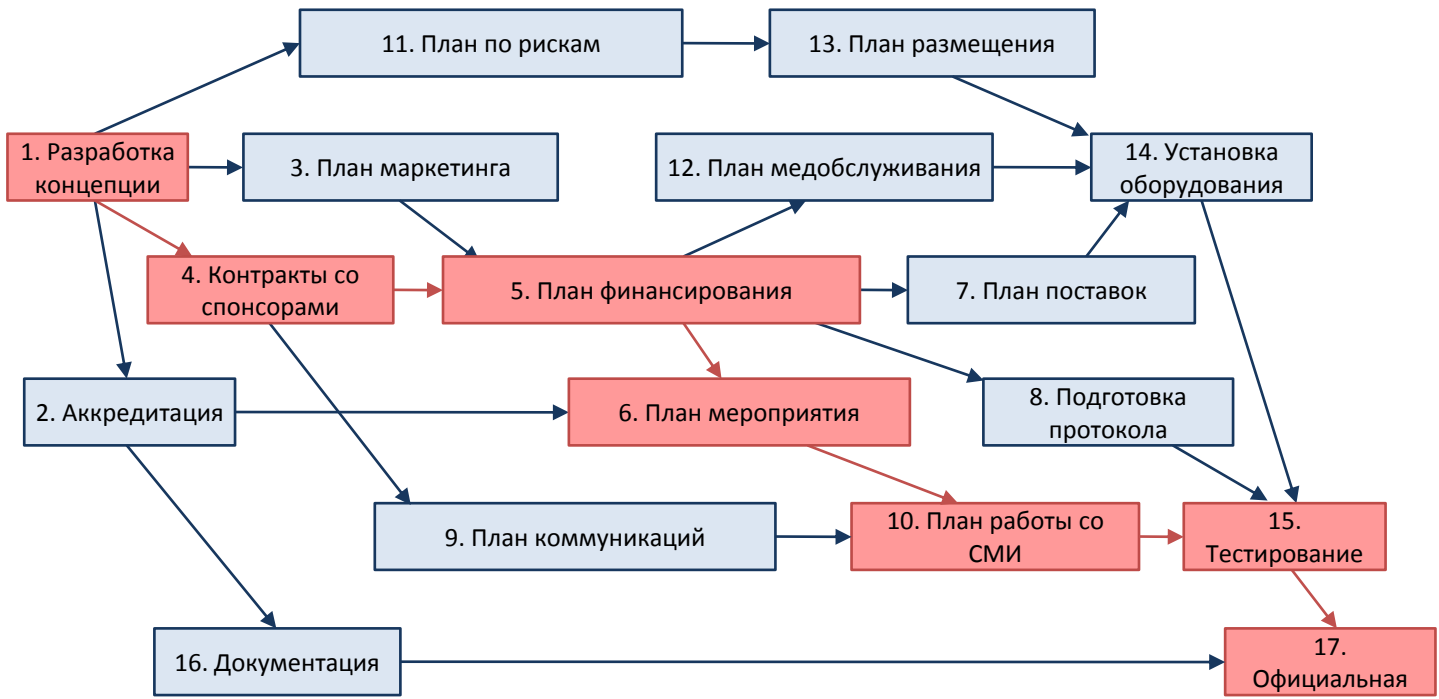


Диаграмма Гантта

